

令和3年度 土木部所管事業における労働災害等発生状況

令和3年6月30時点

①事務所別

(単位：件)

事務所	R3					R3 構成比	R2					R2 構成比	増減 4～6月 ⑤-⑥	参考 R1
	4～6月 ①	7～9月 ②	10～12月 ③	1～3月 ④	合計 ⑤ (①+②+③+④)		4～6月 ⑥	7～9月 ⑦	10～12月 ⑧	1～3月 ⑨	合計 ⑩ (⑥+⑦+⑧+⑨)			
県北建設事務所	7				7	17%	2	4	3	9	18	13%	5	11
県中建設事務所	4				4	10%	5	4	5	7	21	15%	▲1	6
県南建設事務所	2				2	5%	1	3	3	1	8	6%	1	2
会津若松建設事務所	1				1	2%	2	6			8	6%	▲1	5
喜多方建設事務所	1				1	2%	2	1	3		6	4%	▲1	(1)6
南会津建設事務所	4				4	10%		3	1	2	6	4%	4	4
相双建設事務所	6				6	14%	12	5	4	7	28	20%	▲6	16
富岡土木事務所	2				2	5%	1	3	3	3	10	7%	1	2
いわき建設事務所	9				9	21%	2	4	6	6	18	13%	7	12
相馬港湾建設事務所					0	0%		2	1	1	4	3%	0	4
小名浜港湾建設事務所	1				1	2%		2	1	4	7	5%	1	4
福島空港事務所					0	0%	1				1	1%	▲1	0
県北流域下水道建設事務所	3				3	7%				3	3	2%	3	1
県中流域下水道建設事務所					0	0%					0	0%	0	1
営繕課	2				2	5%		1	1		2	1%	2	5
建築住宅課					0	0%	2			1	3	2%	▲2	1
計	42	0	0	0	42	100%	30	38	31	44	143	100%	12	(1)80

○は死亡事故

②分類別

(単位：件)

分類	細分類	R3					R3 構成比	R2					R2 構成比	増減 4～6月 ⑤-⑥	参考 R1
		4～6月 ①	7～9月 ②	10～12月 ③	1～3月 ④	合計 ⑤ (①+②+③+④)		4～6月 ⑥	7～9月 ⑦	10～12月 ⑧	1～3月 ⑨	合計 ⑩ (⑥+⑦+⑧+⑨)			
労働災害	転落・墜落	2				2	5%		2	4	3	9	6%	2	(1)3
	転倒	3				3	7%	4	4	1	1	10	7%	▲1	5
	激突					0	0%			1	1	2	1%	0	1
	飛来・落下					0	0%		3	1		4	3%	0	1
	崩壊・倒壊	3				3	7%					0	0%	3	1
	激突され	2				2	5%			1	3	4	3%	2	2
	挟まれ・巻き込まれ	6				6	14%	5		2	5	12	8%	1	12
	その他	4				4	10%	5	15	3	6	29	20%	▲1	14
	うち熱中症					0	0%	1	8			9	6%	▲1	7
	小計		20	0	0	0	20	48%	14	24	13	19	70	49%	6
公衆災害	工事現場の路面管理	1				1	2%	1				1	1%	0	2
	仮設物					0	0%		1			1	1%	0	4
	上空障害物に係る事故	7				7	17%	3	6	9	6	24	17%	4	8
	埋設物	2				2	5%	5	2	2	4	13	9%	▲3	5
	その他	6				6	14%	5	4	2	6	17	12%	1	12
	小計		16	0	0	0	16	38%	14	13	13	16	56	39%	2
交通事故		3				3	7%	1	1	4	2	8	6%	2	5
施工		3				3	7%					0	0%	3	3
その他(盗難を除く)						0	0%	1		1	7	9	6%	▲1	2
合計		42	0	0	0	42	100%	30	38	31	44	143	100%	12	(1)80

○は死亡事故

令和3年度 土木部所管事業における労働災害等発生状況（月別）

令和3年6月30時点

①事務所別

（単位：件）

事務所	R3												合計
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
県北建設事務所	1	2	4										7
県中建設事務所	0	1	3										4
県南建設事務所	0	0	2										2
会津若松建設事務所	1	0	0										1
喜多方建設事務所	0	1	0										1
南会津建設事務所	0	1	3										4
相双建設事務所	3	3	0										6
富岡土木事務所	2	0	0										2
いわき建設事務所	1	2	6										9
相馬港湾建設事務所	0	0	0										0
小名浜港湾建設事務所	0	0	1										1
福島空港事務所	0	0	0										0
県北流域下水道建設事務所	0	2	1										3
県中流域下水道建設事務所	0	0	0										0
営繕課	1	1	0										2
建築住宅課	0	0	0										0
計	9	13	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42

○は死亡事故


②分類別

（単位：件）


分類	細分類	R2												合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
労働災害	転落・墜落	0	1	1										2
	転倒	2	0	1										3
	激突	0	0	0										0
	飛来・落下	0	0	0										0
	崩壊・倒壊	0	2	1										3
	激突され	2	0	0										2
	挟まれ・巻き込まれ	1	3	2										6
	その他	0	1	3										4
	うち熱中症	0	0	0										0
	小計	5	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
公衆災害	工事現場の路面管理	0	0	1										1
	仮設物	0	0	0										0
	上空障害物に係る事故	3	3	1										7
	埋設物	1	0	1										2
	その他	0	1	5										6
	小計	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
労働災害+公衆災害 合計		9	11	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
交通事故		0	0	3										3
施工		0	2	1										3
その他（盗難を除く）		0	0	0										0
合計		9	13	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42

○は死亡事故


土木部所管事業における労働災害(月別)

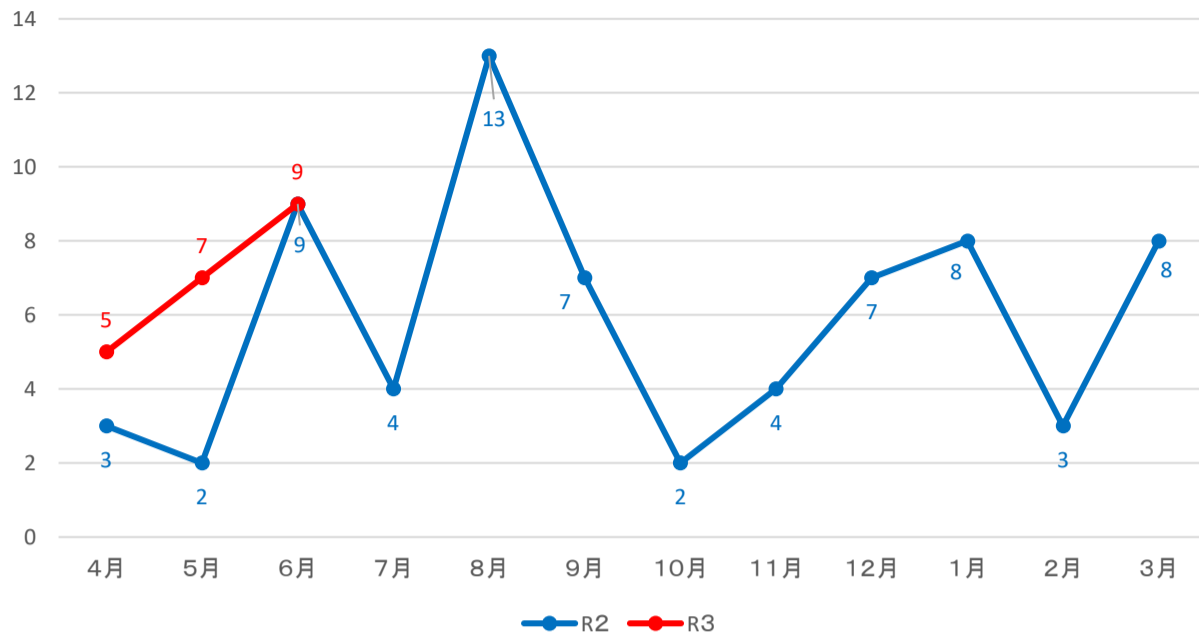


土木部所管事業における公衆災害(月別)

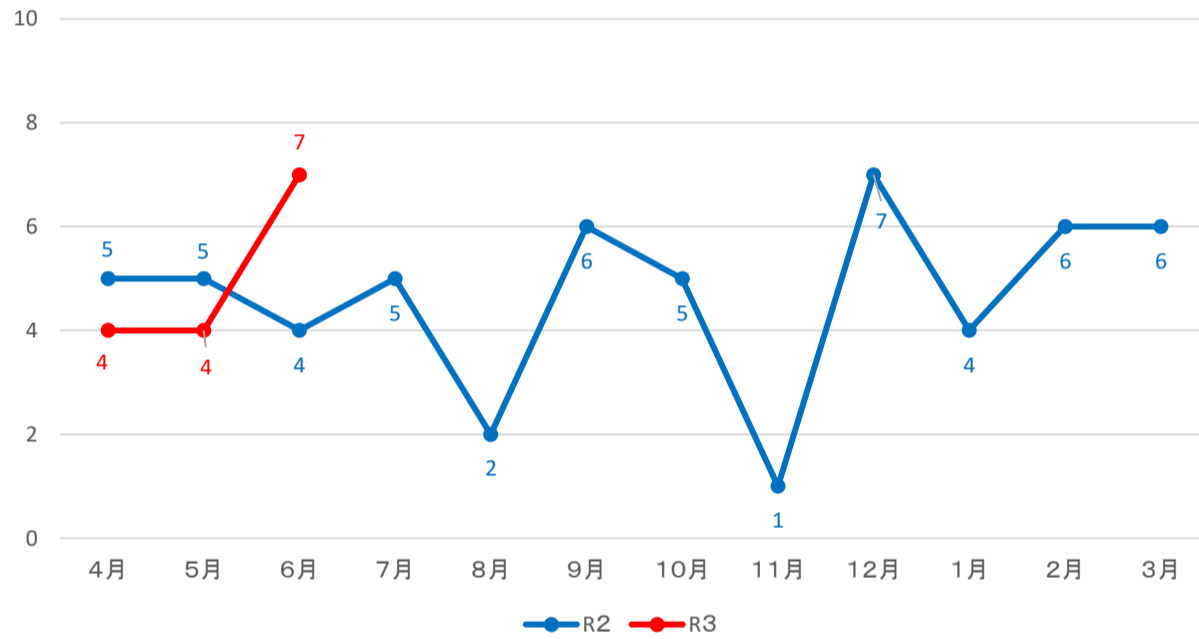


土木部所管事業における労働災害+公衆災害(月別)

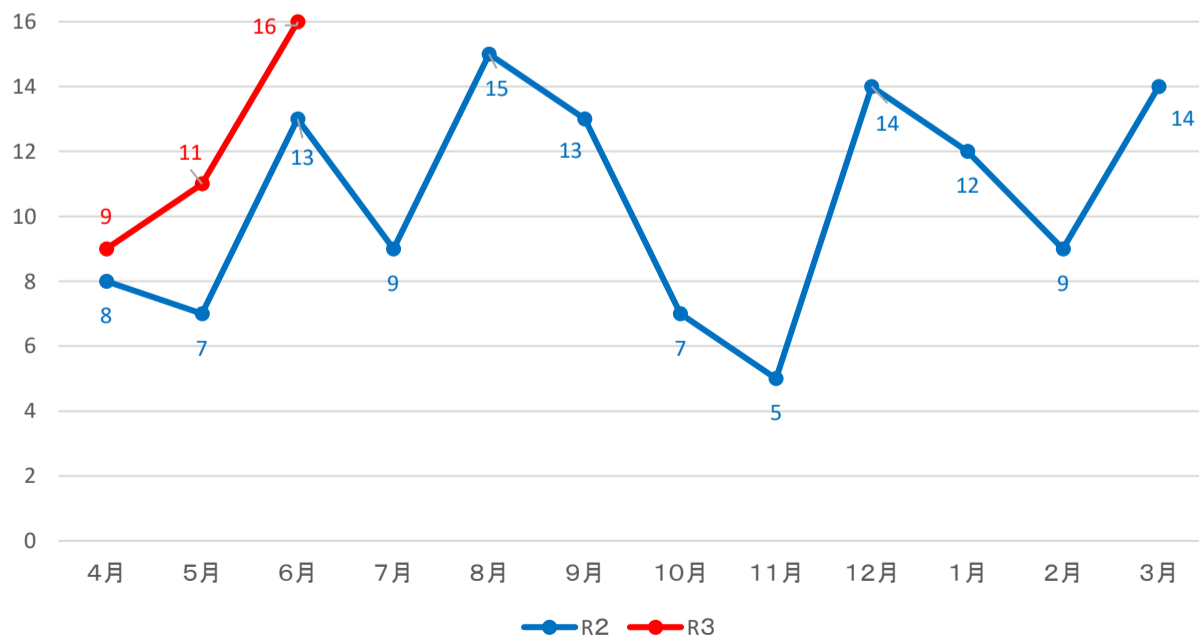


土木部所管事業における労働災害(累計)

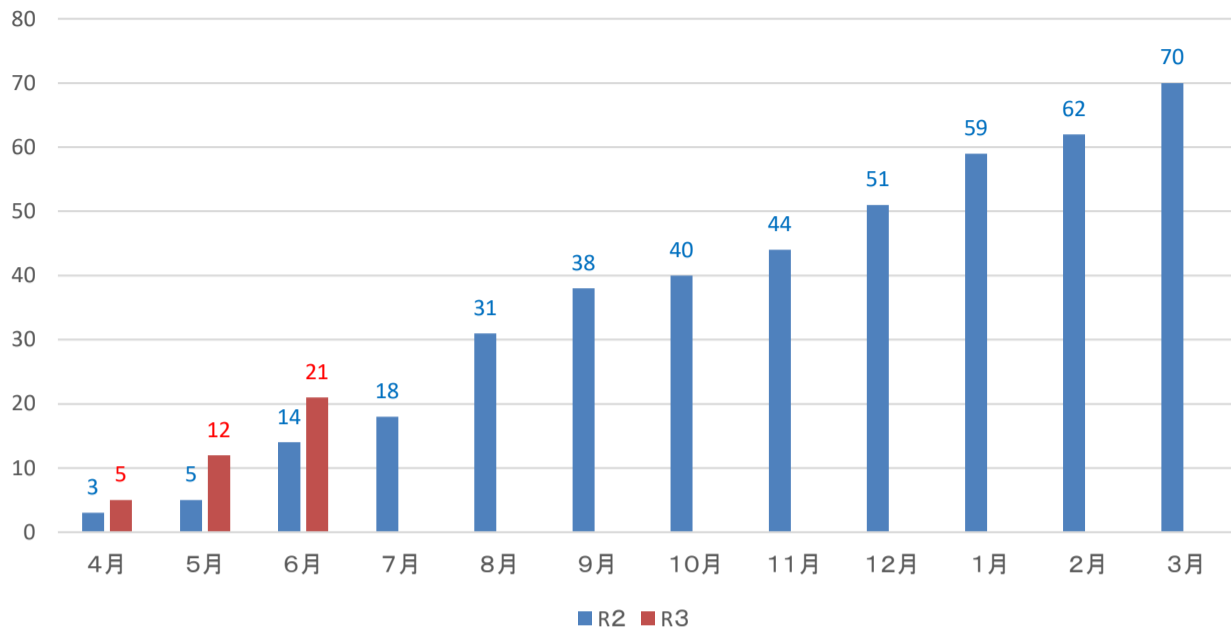

土木部所管事業における公衆災害(累計)

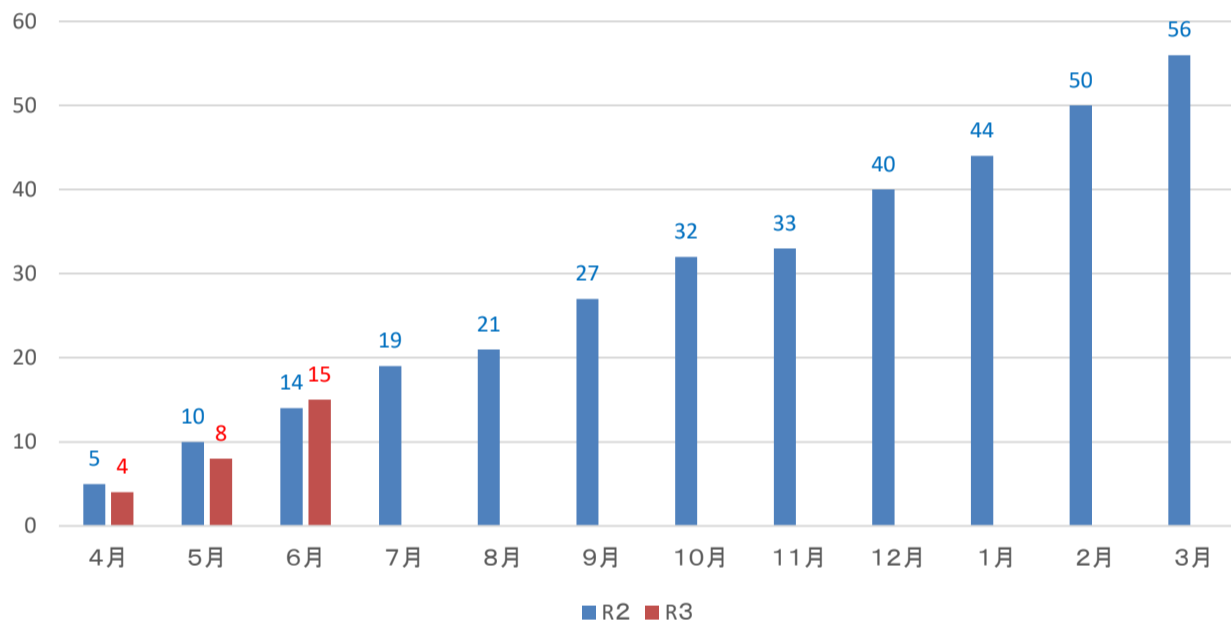

土木部所管事業における労働災害+公衆災害(累計)

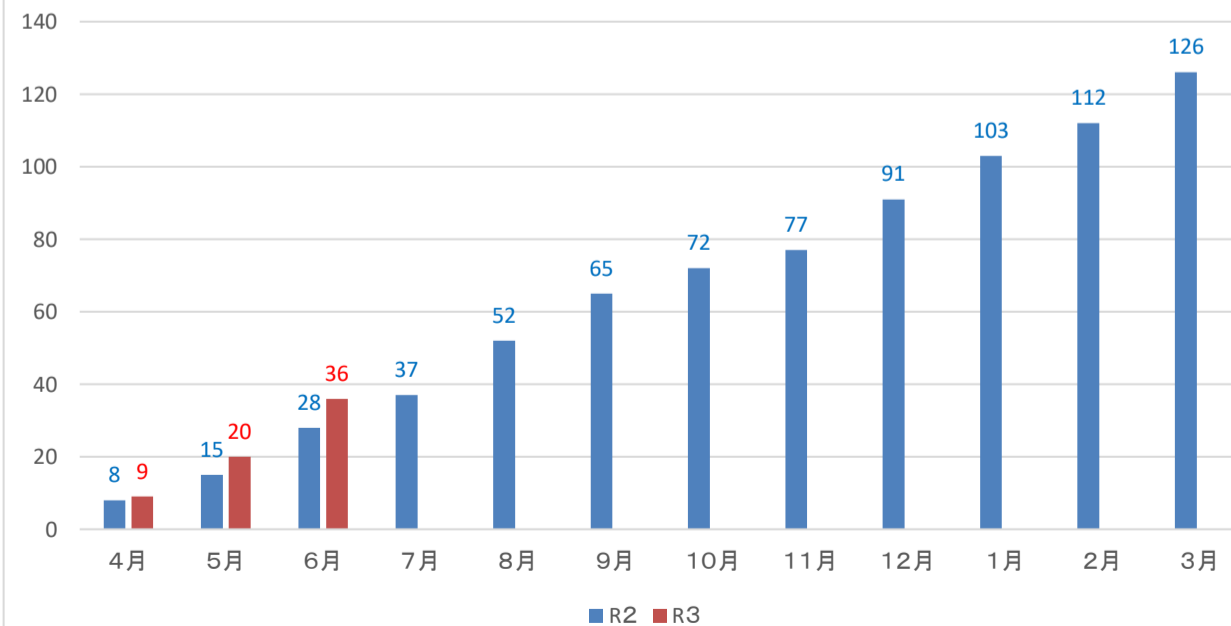

令和3年度土木部所管事業における労働災害等発生状況一覧(R3.6月)

No	分類	細分類	発生日	事務所受信日	発生施設	所管事務所	(准公所)	下請	概要
1	労働災害	転落・墜落	R3.6.30	R3.7.1	道路	県南建設			作業員(38歳)が土砂運搬用の2tダンプ車の荷台に乗り、清掃を行っていたところ、足を滑らせ高さ1m程度の荷台から落ち、腕を骨折。
2	労働災害	転倒	R3.6.8	R3.6.8	道路	南会津建設		○	作業員(55歳)が仮設のモノレールから降りる際に隙間に足を取られ転倒し、手首を負傷。骨折。
3	労働災害	崩壊・倒壊	R3.6.30	R3.6.30	道路	県中建設		○	トンネル起点側坑口付近でセントラルの解体作業を行っていたところ、H鋼の支柱が倒れ、作業員(20歳)が腕を挟み負傷。H鋼が傾いた際逃げようとした作業員2名(61歳、29歳)が転倒するなどしてかすり傷を負った。
4	労働災害	挟まれ・巻き込まれ	R3.6.14	R3.6.14	道路	県中建設			上部工の桁架設中に写真管理をしていた施工会社の社員(26歳・施工体制台帳に入っていない)が支承と桁の間に右手中指・薬指・小指、左手人差指の先端を挟み、末節骨骨折。全治1ヶ月程度。
5	労働災害	挟まれ・巻き込まれ	R3.6.29	R3.6.29	河川	県北建設			大型ブロック設置工においてブロックを掛矢ではめ込む作業をしている際に当該ブロックを手で押さえていた。その際、振り下ろした掛矢が、作業員(28歳)の左手人差し指の先に当たり負傷。
6	労働災害	その他	R3.6.10	R3.6.10	河川	南会津建設	山口土木	○	発電機とポンプを繋ぐキャプタイヤを新規のテープで束ねるため、巻かれていた古いテープを切ろうとしたところ、誤って自分の左手の親指を切った。3針を縫う治療。
7	労働災害	その他	R3.6.25	R3.6.25	河川	南会津建設	山口土木	○	現場作業中に、作業員(49歳)の左目まぶたと頬の2箇所を蜂に刺された。
8	労働災害	その他	R3.6.28	R3.6.28	河川	県北建設		○	積ブロックに水抜きパイプを設置するため、積ブロック(製品)の一部をディスサンダーで切断していたころ、左手首上部に接触して負傷(40歳)。
9	公衆災害	工事現場の路面管理	R3.6.30	R3.6.30	道路	いわき建設			一般ドライバーが通過したところ、路面の凹凸により自家用車を損傷。
10	公衆災害	上空障害物に係る事故	R3.6.9	R3.6.9	河川	県北建設		○	バックホウを移動中、アームに通信線(光ケーブル)を引っ掛け切断。一般住宅1軒で障害が発生。
11	公衆災害	埋設物	R3.6.26	R3.6.28	道路	いわき建設		○	BOXカルバートの床堀中に、他施設の配水管を破損した。
12	公衆災害	その他	R3.6.16	R3.6.16	道路	いわき建設			側溝等を産廃処理のため運搬(産廃処理業者)していたところ、積荷を固定していなかったこと、路面状況に配慮した運転がなされなかったことから、側溝が1本落下(運転手気づかず)。一般の方からの通報により、運搬ルートを進んでいくと、側溝1本が落下しているのを発見。既に警察と国道事務所が交通規制をしていた。
13	公衆災害	その他	R3.6.22	R3.6.22	港湾	小名浜港湾建設			消波ブロックの船への積出し作業を行っていたところ、ブロックを岸壁上部に衝突させ、車止め施設等破損させた。
14	公衆災害	その他	R3.6.27	R3.6.27	河川	いわき建設			床堀法面崩落(高さ5m、延長5m)及び市道舗装クラック(幅3mm、延長5m)。
15	公衆災害	その他	R3.6.28	R3.6.28	道路	県中建設			6月23日道路維持補修業務委託により枝を剪定中、φ15cmの木に切り込みを入れた後、休憩に入り、その後失念。6月28日に道路に倒れた木を車両が避けきれず接触。フロントガラスひび割れ、フェンダーミラー破損。
16	公衆災害	その他	R3.6.29	R3.6.29	河川	県南建設			発注者支援業務のための移動中、現場内において、業務用車両が登坂中に泥濘にはまりスリップ。その際、泥濘から抜け出そうと後進し、車両が路肩外で傾いた状態となってしまう、運転手(支援職員)は車外に避難。後進のギアが入った状態で避難したことから、車両が後進し、現場車両に衝突した。

令和3年度土木部所管事業における労働災害等発生状況一覧(R3.6月)


No	分類	細分類	発生日	事務所受信日	発生施設	所管事務所	(准公所)	下請	概要
17	交通事故		R3.6.11	R3.6.11	河川	いわき建設		○	残土運搬ダンプトラックが停車していたところ、後ろからきた同社の残土運搬ダンプトラックが追突。追突した運転手(71歳)が労災病院へ救急搬送。頸椎捻挫、左膝挫創等(約1週間の休業、約3週間の加療)、追突された運転手(61歳)頸椎捻挫、右膝挫傷(1週間の通院加療)、第三者への被害なし。
18	交通事故		R3.6.15	R3.6.15	河川	いわき建設		○	資材運搬中の2tトラックが前方で一次停止していた軽自動車に追突。両者とも一旦一時停止を行ったが、前方の軽自動車が前進したため、後方の2tトラックも前進したところ前方の軽自動車が急ブレーキで停止したため、追突したもの。軽自動車リアガラス付近損傷。人的被害なし。
19	交通事故		R3.6.28	R3.6.28	道路	県北建設	保原土木		工事用車両(4tダンプ)が工事用道路から一般道へ出る際に、一般道を通行していた軽自動車と接触した。
20	施工		R3.6.28	R3.6.28	その他	県北流域下水道建設			放流ポンプ棟外灯基礎の掘削工事中に、給水配管を重機で切断してしまった。給水配水管が敷設されていることは、事前に確認済みであったが、当初想定していた箇所よりずれて施工されていた。

◎令和3年度土木部所管事業における労働災害 年齢別状況

令和3年6月30時点

年齢	人数
20歳未満	0
20代	4
30代	6
40代	4
50代	3
60歳以上	5
合計	22

労働災害20件中、1件は3名負傷

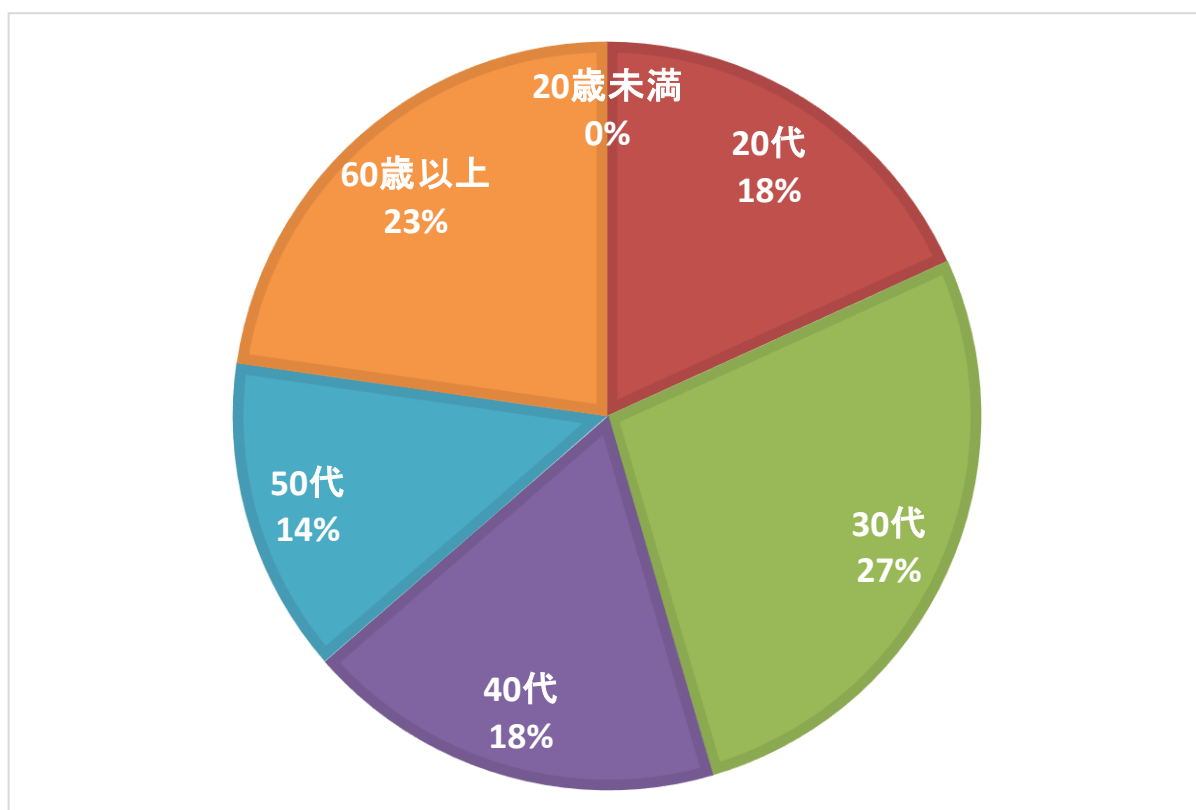

◎令和3年度土木部所管事業における労働災害、公衆災害(下請)状況

令和3年6月30時点

	事故件数	うち下請事故	比率
労働災害	20	14	70%
公衆災害	16	8	50%
